Snapdragon Hill

SUMMIT X CONTRACTORS

Tyler Mckee

Project Start: Mon, 9/7/2020

Display Week: 1
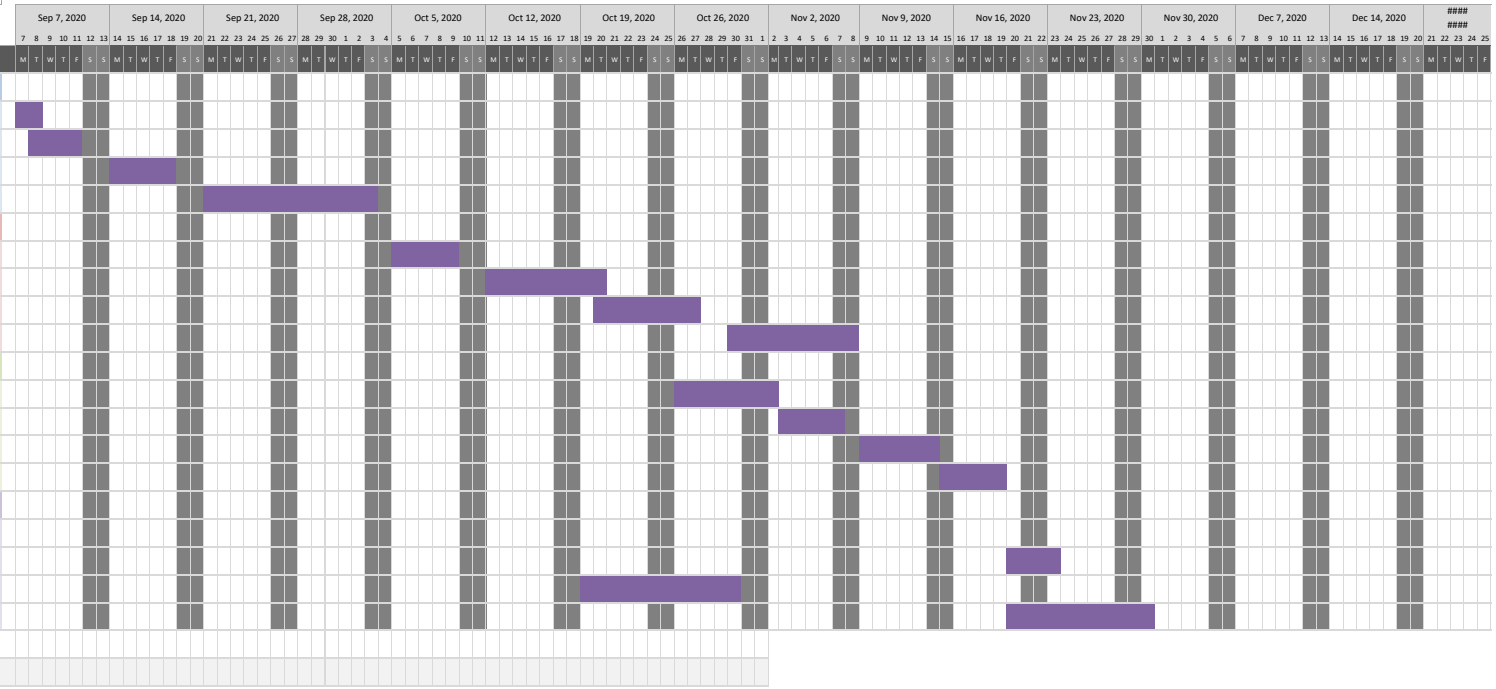
TASK	PROGRESS	START	END
clear and grub, cut/fill			
erosion control BMP	0%	9/7/20	9/8/20
clearing	0%	9/8/20	9/11/20
strip unsuitable soil	0%	9/14/20	9/18/20
cut/fill	0%	9/21/20	10/3/20
Utilities			
sewer	0%	10/5/20	10/9/20
storm	0%	10/12/20	10/20/20
water	0%	10/20/20	10/27/20
joint utility	0%	10/30/20	11/8/20
Road			
sidewalk grade and pour	0%	10/26/20	11/2/20
rough grade road	0%	11/3/20	11/7/20
CSTC/fine grade	0%	11/9/20	11/14/20
paving + patching	0%	11/15/20	11/19/20
misc			
additional work	0%	date	date
bollards	0%	11/20/20	11/23/20
chain link fence	0%	10/19/20	10/30/20
punchlist	0%	11/20/20	11/30/20
